

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 1
		Obra 2528	Revisão 0

INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE CONFORME NR-13

(Conforme Portaria MTP n° 4.219, de 20 de dezembro de 2022)

BUNGE - SANTOS



VP-01 Pulmão de Ar

Este Relatório de avaliação em vaso de pressão segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência à Norma Regulamentadora - NR-13. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Legalmente Habilitado), conforme subitem 13.3.2 da NR-13.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

REVISÕES

A - PRELIMINAR

B - PARA APROVAÇÃO

TE - TIPO EMISSÃO

C - PARA CONHECIMENTO

D - PARA COTAÇÃO

E - PARA CONSTRUÇÃO

**F - CONFORME
COMPRADO**

G - CONFORME CONSTRUÍDO

H - CANCELADO

[illegible]

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Dr. Manoel Tourinho, nº10, Santos / SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187
Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
anos
DEUS É FIELO

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 3
		Obra 2528	Revisão 0

ÍNDICE

1.0 OBJETIVO	4
2.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO	4
2.1 DADOS TÉCNICOS	4
2.2 ENQUADRAMENTO NR-13	5
2.3 DADOS OPERACIONAIS	5
2.4 DADOS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA	5
2.5 DADOS DO MANÔMETRO	6
3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	7
4.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES	7
5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES	8
6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	8
7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA	9
7.1 TIPO DE INSPEÇÃO	9
7.2 ENSAIOS REALIZADOS	9
8.0 CONCLUSÕES GERAIS	9
9.0 PRÓXIMAS INSPEÇÕES	9
10.0 ANEXOS	10
10.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO	11
10.2 CROQUI DO EQUIPAMENTO	12
10.3 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA	13
10.4 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA	14
10.5 CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO	15
10.6 CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA	16
10.7 A.R.T.	17

Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 4
		Obra 2528	Revisão 0

1.0 OBJETIVO

Avaliar através da inspeção de integridade NR-13, os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente e documentações do VP-01 para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Conforme Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022.

2.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO

TAG : VP-01
Descrição : Pulmão de Ar
Relatório : 13-0213
Obra : 2528
Data do relatório : 02/06/2025
Data do Início da Inspeção : 26/05/2025
Data do Término da Inspeção : 26/05/2025
Equipe Técnica Envolvida : Ass. Técnico: Celso Leite Sampaio,
Ass. Técnico: Fernando Wisniewski,
Eng. Responsável: Carlos Henrique de Moraes
Proprietário : BUNGE - SANTOS
Fone/Fax : (13) 3278-79-10
Contato : Nélcio Pinto
Localização : Praça Guilherme Aralhe, 20 - Macuco,
Santos/SP

2.1 DADOS TÉCNICOS

Fabricante : Intecnial
Ano de Fabricação : 1995
Número de Série : 99152594
Tipo do Vaso : Cilindro Vertical
Código de Projeto/Ano : ASME VIII DIV 1
Espessura do corpo medida : 12,48 mm
Espessura do tampo superior medida : 15,9 mm
Espessura do tampo inferior medida : 15,84 mm
Material do corpo - tampo : Aço Carbono
Idade do Vaso : 30 anos
Vazão do Sistema : 1051,56 m³/h
Desenho do conjunto : Nada consta

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 5
		Obra 2528	Revisão 0

2.2 ENQUADRAMENTO NR-13

Fluído Ar Comprimido
Classe : C
Grupo : 3
Categoria : III

2.3 DADOS OPERACIONAIS

	CORPO
Pressão de Projeto (kgf/cm ²) / (kPa)	8,00 / 784,48
Pressão de Teste (kgf/cm ²) / (kPa)	10,50 / 1029,63
PMTA (kgf/cm ²) / (kPa)	8,00 / 784,48
Pressão de Operação (kgf/cm ²) / (kPa)	7,00 / 686,42
Temperatura de Operação (°C)	30°C
Temperatura de Projeto (°C)	100°C
Volume (m ³)	5,0
Produto	Ar Comprimido

2.4 DADOS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA

Nome técnico : VS-001
Fabricante : Fluid Controls
N° de série : 231802
Pressão de Abertura : 8 kgf/cm²
Vazão de Descarga : NADA CONSTA
Última revisão : 25/05/2025
Certificado n.º / Empresa : 5836/25 - Conerge
Tipo da válvula : ALÍVIO
Selo ASME : SIM
Norma de Fabricação : ASME VIII
Instalação / localização : Corpo do vaso de pressão

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 6
		Obra 2528	Revisão 0

2.5 DADOS DO MANÔMETRO

Nome Técnico (TAG) : PI-022
 Fabricante : Aesco
 N° de série : NADA CONSTA
 Diâmetro da Conexão : 1/4"
 Diâmetro do Corpo : 100 mm
 Última revisão : 25/05/2025
 Range de Escala : 0,00 ~10 Bar
 Certificado n. ° / Empresa : 5843/25 - Conerge
 Instalação / localização : Corpo do vaso de pressão


Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 7
		Obra 2528	Revisão 0

3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P ₀	PRESERVAR A SEGURANÇA À VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.
P ₁	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
P ₂	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS.
P ₃	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

4.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES

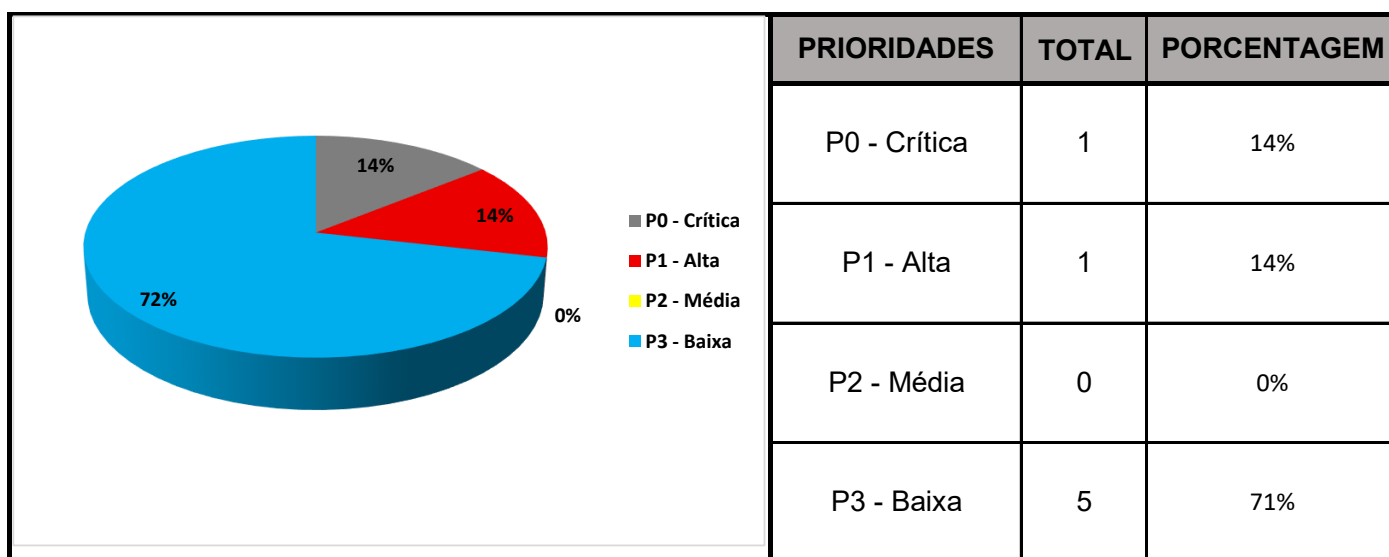


Propriedade Exclusiva do GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 8
		Obra 2528	Revisão 0

5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE/INFRAÇÃO	
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE
P0	I-4
P1	I-3
P2	I-2
P3	I-1

6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO

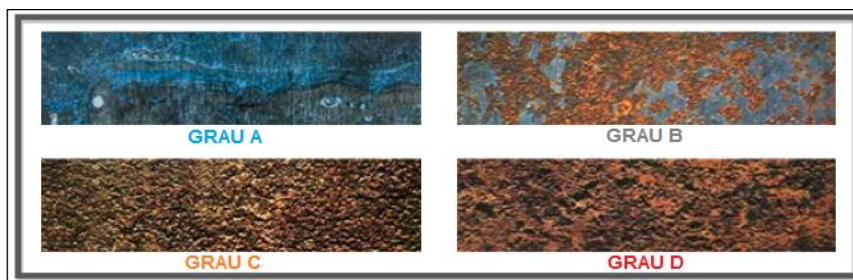

- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 9
		Obra 2528	Revisão 0

7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

7.1 TIPO DE INSPEÇÃO

☐ Inicial
 ☒ Periódica
 ☐ Extraordinária
☒ Externa
 ☐ Interna
 ☐ TH/Estanqueidade

7.2 ENSAIOS REALIZADOS

☒ Medição de Espessura
 ☐ Líquido penetrante
 ☐ Partícula Magnética
☐ Ultrassom
 ☐ Boroscopia
 ☒ Visual

8.0 CONCLUSÕES GERAIS

Este Reservatório de Ar está sendo **APROVADO** nesta data, porém necessário atender as solicitações no item de Recomendações deste relatório.

9.0 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Próxima Externa: **26/05/2026**

Próxima Interna: **12/06/2028**

CONTROLE DE EMISSÃO			
Profissional Legalmente Habilitado NR-13	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	02/06/2025 Data

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 10
		Obra 2528	Revisão 0

10.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 11
		Obra 2528	Revisão 0


10.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13						
Cliente / Unidade:		Bunge - Santos/SP		Data:		02/06/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:		VP-01		Nº do Relatório:		13-0213		P-0 = Crítico
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P-1 = Prioridade Alta
								P-2 = Prioridade Média
								P-3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	ALÍNEA	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	VASO DE PRESSÃO - INTEGRIDADE	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que a integridade do pulmão de ar está em bom estado de conservação, mas encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
2	PINTURAS	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as pinturas do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
3	CONEXÕES	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as conexões do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
4	TAMPO SUPERIOR	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que o tampo superior do vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação, mas encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	
5	CASCO	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que o casco do vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
6	TAMPO INFERIOR	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que o tampo inferior do vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação, mas encontra-se com excesso de sujidade.	Necessário realizar limpeza periódica do equipamento.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13						
Cliente / Unidade:		Bunge - Santos/SP		Data:		02/06/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:		VP-01		Nº do Relatório:		13-0213		P-0 = Crítico
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P-1 = Prioridade Alta
								P-2 = Prioridade Média
								P-3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	ALÍNEA	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
7	BASES DOS PÉS DE APOIOS	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as bases dos pés de apoios do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
8	TUBULAÇÕES	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as tubulações do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação, mas encontra-se com excesso de sujeira.	Necessário realizar limpeza periódica e pintura do equipamento.	P-3	
9	VÁLVULAS DE SEGURANÇA	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as válvulas de segurança do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
10	MANÔMETROS	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que os manômetros do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
11	SOLDAS	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as soldas do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
12	PARAFUSOS	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que os parafusos do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13						
Cliente / Unidade:		Bunge - Santos/SP		Data:		02/06/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:		VP-01		Nº do Relatório:		13-0213		P-0 = Crítico
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P-1 = Prioridade Alta
								P-2 = Prioridade Média
								P-3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	ALÍNEA	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	CHUMBADORES	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que os chumbadores do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
14	BASES DE CONCRETO	EXTERNA	INSPEÇÃO	-	Foi evidenciado que as bases de concreto do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
15	ENSAIO MEDIÇÃO	EXTERNA	END's	-	A CONERGE realizou a medição de espessura no vaso de pressão.	Nada consta.	-	
16	VAZÃO	EXTERNO	-	-	Foi evidenciado que encontram-se instalados mais compressores de ar na linha.	Necessário elaborar um estudo de caso para verificar a vazão completa do sistema.	P-1	DOCUMENTAÇÃO
17	CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO	REQUISITO LEGAL	13.3.6	-	A CONERGE realizou a calibração do manômetro do vaso de pressão.	Nada consta.	-	
18	CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA	REQUISITO LEGAL	13.3.6	-	A CONERGE realizou a calibração da válvula de segurança do vaso de pressão.	Nada consta.	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13						
Cliente / Unidade:		Bunge - Santos/SP		Data:		02/06/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:		VP-01		Nº do Relatório:		13-0213		P-0 = Crítico
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P-1 = Prioridade Alta
								P-2 = Prioridade Média
								P-3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	ALÍNEA	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
19	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.3	-	Foi evidenciado que a placa de identificação do vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
20	IDENTIFICAÇÃO DE TAG / CATEGORIA	REQUISITO LEGAL	13.5.1.4	-	Foi evidenciado que o tag / categoria do vaso de pressão encontra-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
21	VASO DE PRESSÃO PRONTUÁRIO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.5	a) - I	Foi evidenciado que o equipamento possui prontuário.	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
22	MEMÓRIAL DE CÁLCULO - DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.5	a) - IV	Foi evidenciado que o equipamento possui memorial de cálculo da PMTA.	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
23	LIVRO DE REGISTRO - DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.5	b)	Foi evidenciado que o equipamento possui livro de registro de segurança.	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
24	RELATÓRIO - DOCUMENTAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.5	d)	Foi evidenciado que o equipamento possui relatório.	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13						
Cliente / Unidade:		Bunge - Santos/SP		Data:		02/06/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:		VP-01		Nº do Relatório:		13-0213		P-0 = Crítico
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P-1 = Prioridade Alta
								P-2 = Prioridade Média
								P-3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	ALÍNEA	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	VÁLVULA DE SEGURANÇA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.6	e)	Foi evidenciado que a válvula de segurança possui certificado de calibração	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
26	MANÔMETRO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.1.6	e)	Foi evidenciado que o manômetro possui certificado de calibração	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
27	DRENO INTEGRIDADE	REQUISITO LEGAL	13.5.2.1	-	Foi evidenciado que o dreno do pulmão de ar encontram-se sem a haste da válvula de bloqueio.	Necessário providenciar/ instalar a haste da válvula de bloqueio.	P-3	
28	SAÍDAS DO AMBIENTE	REQUISITO LEGAL	13.5.2.2	a)	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do vaso de pressão possui pelo menos 2 saídas amplas e desobstruídas.	Nada consta.	-	
29	AMBIENTE	REQUISITO LEGAL	13.5.2.2	b)	Foi evidenciado que acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas.	Nada consta.	-	
30	VENTILAÇÃO DO AMBIENTE	REQUISITO LEGAL	13.5.2.2	c)	Foi evidenciado que o ambiente de instalação do vaso de pressão possui ventilação adequada.	Nada consta.	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13						
Cliente / Unidade:		Bunge - Santos/SP		Data:		02/06/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:		VP-01		Nº do Relatório:		13-0213		P-0 = Crítico
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P-1 = Prioridade Alta
								P-2 = Prioridade Média
								P-3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL INSPECIONADO	TIPO DE INSPEÇÃO	ITEM	ALÍNEA	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
31	SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	REQUISITO LEGAL	13.5.2.2	d)	Foi evidenciado que os sistemas de iluminação da rede do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
32	SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	REQUISITO LEGAL	13.5.2.2	e)	Foi evidenciado que os sistemas de iluminação de emergência do vaso de pressão encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
33	ATERRAMENTO ESTÁTICO	REQUISITO LEGAL	13.5.2.4	-	Foi evidenciado que o vaso não possui aterramento estático conforme NBR 15417/07 item 5.1.1 alínea d).	Necessário providenciar a instalação de aterramento estático.	P-0	
34	TESTE HIDROSTÁTICO	REQUISITO LEGAL	13.5.4.3	-	Foi evidenciado que o equipamento possui Teste Hidrostático.	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO


 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 12
		Obra 2528	Revisão 0

10.2 CROQUI DO EQUIPAMENTO

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

CLIENTE:	BUNGE	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	VP-01	OBRA:	2528
DESCRIÇÃO:	Pulmão de Ar	DATA EXECUÇÃO:	26/05/2025

CROQUI DO EQUIPAMENTO

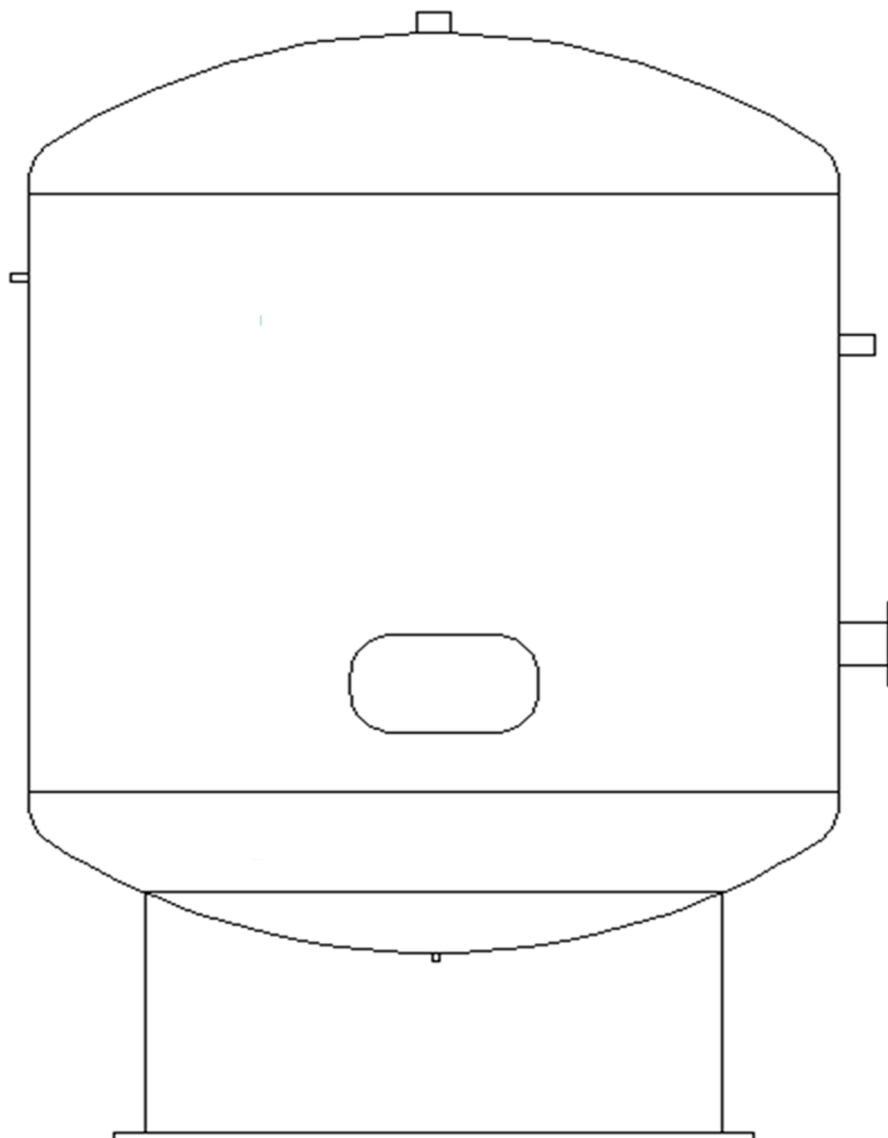

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 13
		Obra 2528	Revisão 0

10.3 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

CLIENTE:	BUNGE	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	VP-01	OBRA:	2528
DESCRIÇÃO:	Pulmão de Ar	DATA EXECUÇÃO:	26/05/2025


Norma de referência / Critério de aceitação:	Nº do procedimento / Revisão	Material:	
ASME V ART. 23	PTP-013 02	AÇO CARBONO	
Equipamento:	Bloco de calibração:	Acoplante:	
ME-003	BL-006 AÇO CARBONO 6 DEGRAUS	METIL CELULOSE	
Transdutor:	Temperatura (° C):	Iluminação / lux	
DA 501 EN / 5 MHz / Ø 10mm	25	AMBIENTE	1000
Método utilizado:	Condição superficial:		
PULSO-ECO	SOB CAMADA DE TINTA		

RESULTADO

Foi realizado medição de espessura conforme consta na tabela abaixo.

PONTO MEDIDO	POSIÇÃO					ESPESSURA DE CALIBRAÇÃO (mm)	ESPESSURA ATUAL (mm)	ESPESSURA NOMINAL (mm)	ESPESSURA MÍNIMA (mm)	REDUÇÃO (mm)
	0°	90°	180°	270°	CENTRO					
TAMPO SUPERIOR	16,32	16,01	15,90	16,07	-	20,00	15,90	16,40	9,61	0,50
CASCO	12,67	12,56	12,48	12,61	-	20,00	12,48	12,50	10,30	0,02
TAMPO INFERIOR	15,91	16,62	16,46	15,84	-	20,00	15,84	16,40	9,61	0,56

OBS: CROQUI EM ANEXO

Data do Relatório:	Nº Relatório	Técnico Responsável: Celso Leite Sampaio	Engº Responsável: Carlos Henrique de Moraes
02/06/2025	13-0213	 Celso Leite Sampaio US-ME-N2 ASNT/END Nº UT-9836 ME	 Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984

Propriedade Exclusiva da CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Dr. Manuel Tourinho, 10 - Vila Matias CEP: 11.015-030 - Santos - SP - Voip: (13) 3466-7187


comercial@conerge-engenharia.com.br

www.conerge-engenharia.com

Deus é fiel

CLIENTE:	BUNGE	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	VP-01	OBRA:	2528
DESCRIÇÃO:	Pulmão de Ar	DATA EXECUÇÃO:	26/05/2025

CROQUI DO EQUIPAMENTO

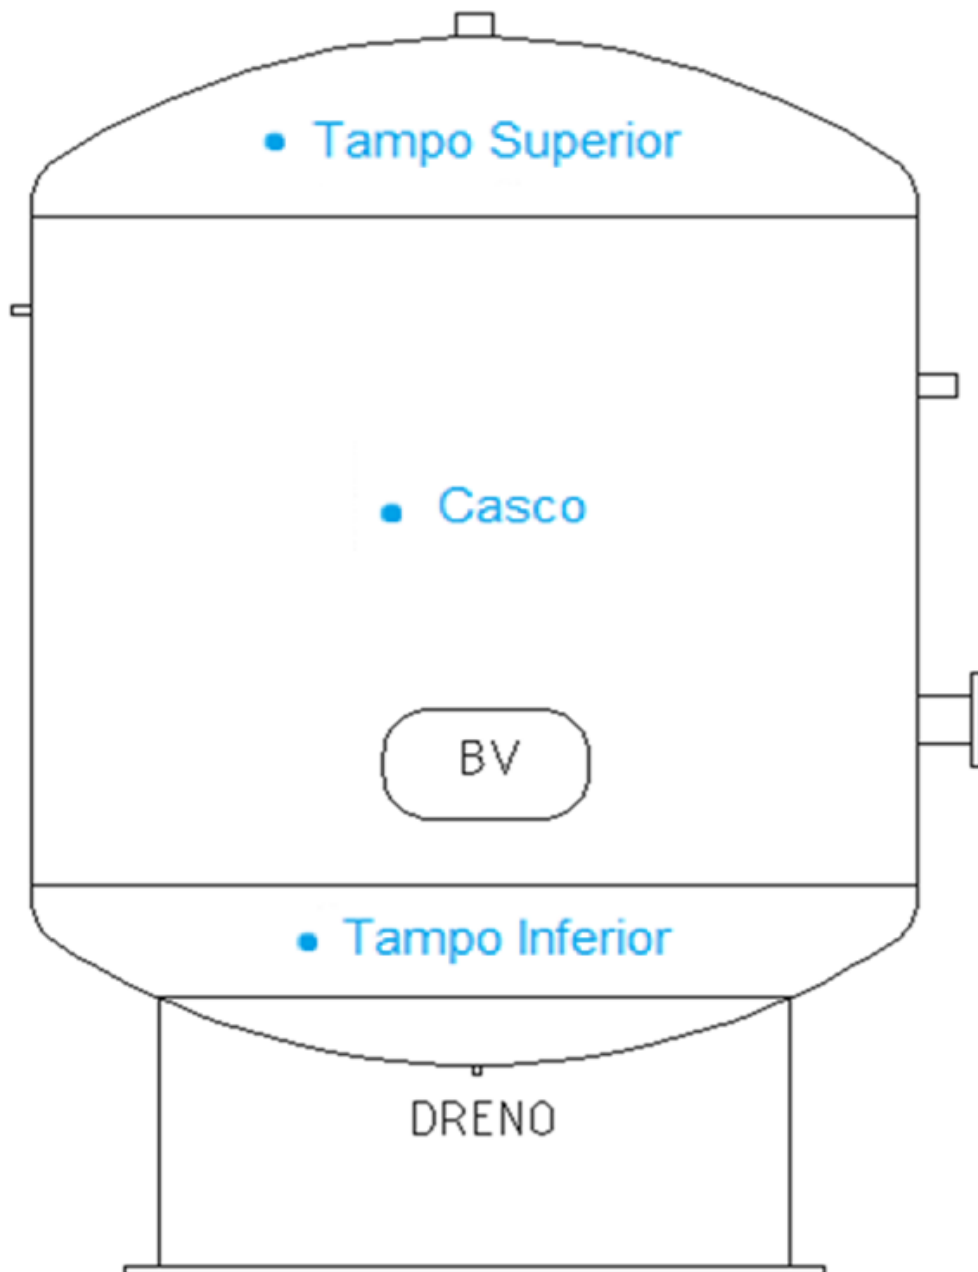

MEDIÇÃO DE ESPESSURA

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 14
		Obra 2528	Revisão 0

10.4 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO CEIME
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO



Página: 1 / 1

OS: 71655/2025 MPD-17071655 CCM28483/25

Solicitante: CONERGE INSPECAO E ENGENHARIA LTDA

Contratante: O MESMO

Endereço: RUA DOUTOR MANOEL TOURINHO, 10

Serviço executado no laboratório da Ceime - Unidade INDAIATUBA

MANOMETRO

Identificação: MPD-170

Emissão: 27/02/2025

Calibração: 27/02/2025

Validade: 02/2026

Modelo: Não Consta

Marca: INSTRUTHERM

Nº Série: 21092301386524

Temperatura ambiente: (inicial: 20°C final: 20°C) Umidade relativa do ar: (inicial: 55% final: 55%)

Calibração Executada Conforme: ITINM033 Revisão 17

Síntese do Procedimento

O manômetro calibrado foi montado na bomba comparadora, sendo gerado os valores de pressão previamente estabelecidos, referenciados no manômetro e lidos no padrão. Foram realizados 2 ciclos de medição.

Padrão utilizado

PTP-0094 Manometro 1000 bar

Marca

Gulton

Certificado

CAL - 243877 / 24

Calibrado por

CAL 0056

Validade

10/2025

RESULTADOS

Faixa de Uso: (0 a 1000) bar

Faixa de Indicação: (0 a 1000) bar

Valor de uma Divisão : 0,1 bar

V.I.		Carrego Ciclo (1) bar	Descarrego Ciclo (1) bar	Carrego Ciclo (2) bar	Descarrego Ciclo (2) bar	Incerteza Expandida bar	(k)	Veff
kPa	bar							
10000,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,0	2,00	> 502
30000,0	300,0	298,0	298,0	299,0	298,0	1,8	2,12	22
50000,0	500,0	496,0	495,0	495,0	495,0	1,8	2,12	22
70000,0	700,0	690,0	689,0	690,0	689,0	3,5	2,20	14
90000,0	900,0	887,0	886,0	888,0	887,0	3,5	2,52	6

O fator de transformação da unidade de medida (bar) para a unidade (kPa) do Sistema Internacional (S.I.) utilizado foi (100) .

Observações e Vocabulário

ERRO FIDUCIAL...: 1,40% REPETIBILIDADE...: 0,10% HISTERESE.....: 0,10%

- [V.I.] Valor do Instrumento - A Incerteza Expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, de tal forma que a probabilidade de abrangência corresponda a aproximadamente 95%. - Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica quando aplicável
- A condição de Aprovado/Reprovado se restringe apenas as grandezas metrológicas do instrumento e não faz parte do escopo de acreditação do laboratório, sendo que o limite de erro especificado para esta condição é de responsabilidade do Cliente. - A operação de ajuste/regulagem não faz parte do escopo de acreditação.
- A validade apresentada neste certificado é de responsabilidade do Cliente e não faz parte do escopo de acreditação do laboratório.

VICTOR ERMETTI VERON
Executor Técnico

Responsável Solicitante

FRANCIS RICARDO A. BUSINARO
SIGNATARIO AUTORIZADO
LABORATÓRIO CEIME INDAIATUBA

Os resultados apresentados neste documento têm significado restrito e se aplicam somente ao item calibrado. É proibida a reprodução parcial do mesmo e/ou com alteração. Utilizar o mesmo para fins promocionais somente com autorização da Ceime.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 15
		Obra 2528	Revisão 0

10.5 CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 16
		Obra 2528	Revisão 0

10.6 CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Certificado de Calibração: 5836/25

Santos, 02/06/2025

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: BUNGE - SANTOS
ENDEREÇO: Praça Guilherme Aralhe, 20 - Macuco, Santos - SP, 11015-305

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO:	VÁLVULA DE SEGURANÇA	IDENTIFICAÇÃO - TAG:	VS-001 - VP-01
MODELO:	VS-500-1	FABRICANTE:	Fluid Controls
NÚMERO DO LACRE:	0000132	NÚMERO DE SÉRIE:	231802
BALANCEADA:	Não	CONEXÃO:	1.1/2"
PRESSÃO DE ABERTURA:	8 kgf/cm ²	FLUÍDO TESTE:	Água
SELO UV:	Não	VAZÃO:	Nada Consta

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (Kgf/cm ²)	Leitura 1 (Kgf/cm ²)	Leitura 2 (Kgf/cm ²)	Leitura 3 (Kgf/cm ²)	Média	Tendência	Incerteza	Tendência + U95
-	-	-	-	-	-	(U95)	-
8,00	8,10	8,00	8,00	8,03	0,03	0,15089	0,18422

Pior tendência = -0,03

Pior incerteza (U95) = 0,15089 Kgf/cm²; Veff = 2,000; K = 4,52656

Pior |tendência+U95| = 0,18422 Kgf/cm²

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Manômetro Padrão	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	71655/2025	Manômetro	0.01	27/02/2026	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 0

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 21 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95,45 % de certeza.
Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais.

Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui obtidas.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CONDIÇÕES:	000-Condições Normais	LAUDO FINAL:	APROVADO
DATA CALIBRAÇÃO:	26/05/2025	PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:	26/05/2026

8 - COMENTÁRIOS:

Nada consta.

9 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



10 - CONTROLE DE EMISSÃO:

ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Dir. Engenharia

 A Engenharia das NRs		BUNGE - SANTOS	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0213	Página 17
		Obra 2528	Revisão 0

10.7 A.R.T.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620250996375

1. Responsável Técnico**CARLOS HENRIQUE DE MORAES**Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**RNP: **2603421441**Registro: **0640977984-SP**Empresa Contratada: **CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**Registro: **0548001-SP****2. Dados do Contrato**Contratante: **BUNGE ALIMENTOS S/A**CPF/CNPJ: **84.046.101/0582-72**Endereço: **Praça GUILHERME ARALHE**Nº: **20**

Complemento:

Bairro: **MACUCO**Cidade: **Santos**UF: **SP**CEP: **11015-305**Contrato: **Pr. 6.127/25 / Obra 2.528**Celebrado em: **22/05/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1500,00**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra ServiçoEndereço: **Praça GUILHERME ARALHE**Nº: **20**

Complemento:

Bairro: **MACUCO**Cidade: **Santos**UF: **SP**CEP: **11015-305**Data de Início: **25/05/2025**Previsão de Término: **04/07/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **BUNGE ALIMENTOS S/A**CPF/CNPJ: **84.046.101/0582-72****4. Atividade Técnica****Supervisão****1****Inspeção****de segurança em
caldeiras e/ou vasos de
pressão (NR13)**

Quantidade

Unidade

6,00000**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRA 2.528 - BUNGE SANTOS/SP - NR-13 - INSPEÇÃO EM VASOS DE PRESSÃO E CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS (MANÔMETROS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA). VASOS DE PRESSÃO - TAG'S: VP-01, VP-02, VP-04, VP-09, VP-11, VP-13.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTOS 27 de JUNHO de 2025

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

BUNGE ALIMENTOS S/A - CPF/CNPJ: 84.046.101/0582-72

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 11/06/2025

Valor Pago R\$ 103,03

Nosso Número: 2620250996375

Versão do sistema

Impresso em: 11/06/2025 16:22:44



Auteticação de ART
2620250996375
