

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 1
		Obra 2507	Revisão 0

INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE CONFORME NR-13

(Conforme Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022)

RUMO - SÃO SIMÃO



CP - TERM - 04 COMPRESSOR DE AR

Este Relatório de avaliação em vaso de pressão segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência à Norma Regulamentadora - NR - 13. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Legalmente Habilitado), conforme subitem 13.3.2 da NR-13.

REVISÕES

COMPRADO

[illegible]

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 3
		Obra 2507	Revisão 0

ÍNDICE

1.0 OBJETIVO	4
2.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO.....	4
2.1 DADOS TÉCNICOS	4
2.2 ENQUADRAMENTO NR-13	5
2.3 DADOS OPERACIONAIS	5
2.4 DADOS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA	5
2.5 DADOS DO MANÔMETRO	6
2.6 DADOS DO PRESSOSTATO	6
3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	6
4.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES.....	7
5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES.....	7
6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	8
7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA.....	8
7.1 TIPO DE INSPEÇÃO	8
7.2 TIPO DE INSPEÇÃO	9
8.0 CONCLUSÕES GERAIS.....	9
9.0 PRÓXIMAS INSPEÇÕES	9
10. ANEXOS	10
10.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO.....	11
10.2 CROQUI DO EQUIPAMENTO.....	12
10.3 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA.....	13
10.4 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA.....	14
10.5 CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO.....	15
10.6 CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA.....	16
10.7 CALIBRAÇÃO DO PRESSOSTATO.....	17
10.8 A.R.T	18

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 4
		Obra 2507	Revisão 0

1.0 OBJETIVO

Avaliar através da inspeção de integridade NR-13, os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente e documentações do compressor de ar CP - TERM - 04 para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Conforme Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022.

2.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO

TAG..... : CP - TERM - 04
Descrição..... : Compressor de ar
Área..... : SALA DOS COMPRESSORES EXPEDIÇÃO
Relatório..... : 13-0191
Obra..... : 2507
Data do relatório..... : 17/02/2025
Data do Início da Inspeção..... : 21/01/2025
Data do Término da Inspeção..... : 24/01/2025
Equipe Técnica Envolvida..... : Ass. Técnico: Fernando Wisniewski Junior
Ass. Engenharia: Celso Leite Sampaio
Eng. Responsável: Carlos Henrique de Moraes
Proprietário..... : RUMO - SÃO SIMÃO/GO
Fone/Fax..... : 64 9965-3413
Responsável..... : Luis Felippe
Localização..... : Fazenda Rondinha, Av. Eliezer Oliveira
Guimarães, S/N

2.1 DADOS TÉCNICOS

Fabricante..... : SCHULZ Compressores LTDA
Ano de Fabricação..... : 2020
Número de Série..... : I-188552
Tipo do Vaso..... : Compressor de ar
Código de Projeto/Ano..... : ASME VIII DIV I ED. 2019
Espessura do costado medida..... : 5,00 mm
Espessura dos tampos medida..... : 4,92 mm
Material do corpo - tampo..... : SA – 414 grau D (Adotado)
Idade do Vaso..... : 5 Anos
Vazão do Sistema..... : 101,94 m³/h
Desenho do conjunto..... : NADA CONSTA

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 5
		Obra 2507	Revisão 0

2.2 ENQUADRAMENTO NR-13

Fluido..... : AR COMPRIMIDO
 Classe..... : C
 Grupo..... : 5
 Categoria..... : V

2.3 DADOS OPERACIONAIS

	CORPO
Pressão de Projeto (kgf/cm ²) / (kPa)	13,44 / 1318.01
Pressão de Teste (kgf/cm ²) / (kPa)	17,48 / 1714,20
PMTA (kgf/cm ²) / (kPa)	13,44 / 1318.01
Pressão de Operação (kgf/cm ²) / (kPa)	12,30 / 1206.22
Temperatura de Operação (°C)	25 °C
Temperatura de Projeto (°C)	230°C
Volume (m ³)	0,427
Produto	AR COMPRIMIDO

2.4 DADOS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA

Nome técnico..... : PSV-01 (CP-TERM-04)
 Fabricante..... : LUBE-FER
 N° de lacre..... : 0000185
 N° de série..... : 1017026
 Pressão de Abertura..... : 11 bar
 Vazão de Descarga..... : 85,5 m³/h
 Última revisão..... : 23/01/2025
 Certificado n.º / Empresa..... : 5738/25 - CoNeRge
 Tipo da válvula..... : SEGURANÇA
 Selo ASME..... : NÃO
 Norma de Fabricação..... : NÃO
 Instalação / localização..... : CORPO DO COMPRESSOR DE AR

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 6
		Obra 2507	Revisão 0

2.5 DADOS DO MANÔMETRO

Nome Técnico (TAG)..... : MAN-01 (CP-TERM-04)
Fabricante..... : FÊNIX DO BRASIL
N° de lacre..... : 0000184
N° de série..... : NADA CONSTA
Última revisão..... : 23/01/25
Range de Escala..... : 0 ~ 20 bar
Certificado n. ° / Empresa..... : 5737/25 - CoNeRge
Instalação / localização..... : CORPO DO COMPRESSOR DE AR

2.6 DADOS DO PRESSOSTATO


Nome Técnico (TAG)..... : PRESS-01 (CP-TERM-04)
Fabricante..... : LEF00
N° de lacre..... : 0000186
N° de série..... : NADA CONSTA.
Ajuste ligado..... : 9 bar
Ajuste desligado..... : 6 bar
Última revisão..... : 23/01/25
Certificado n. ° / Empresa..... : 5739/25 - CoNeRge
Instalação / localização..... : CP-TERM-04

3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P ₀	PRESERVAR A SEGURANÇA À VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.
P ₁	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
P ₂	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS.
P ₃	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 7
		Obra 2507	Revisão 0

4.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES

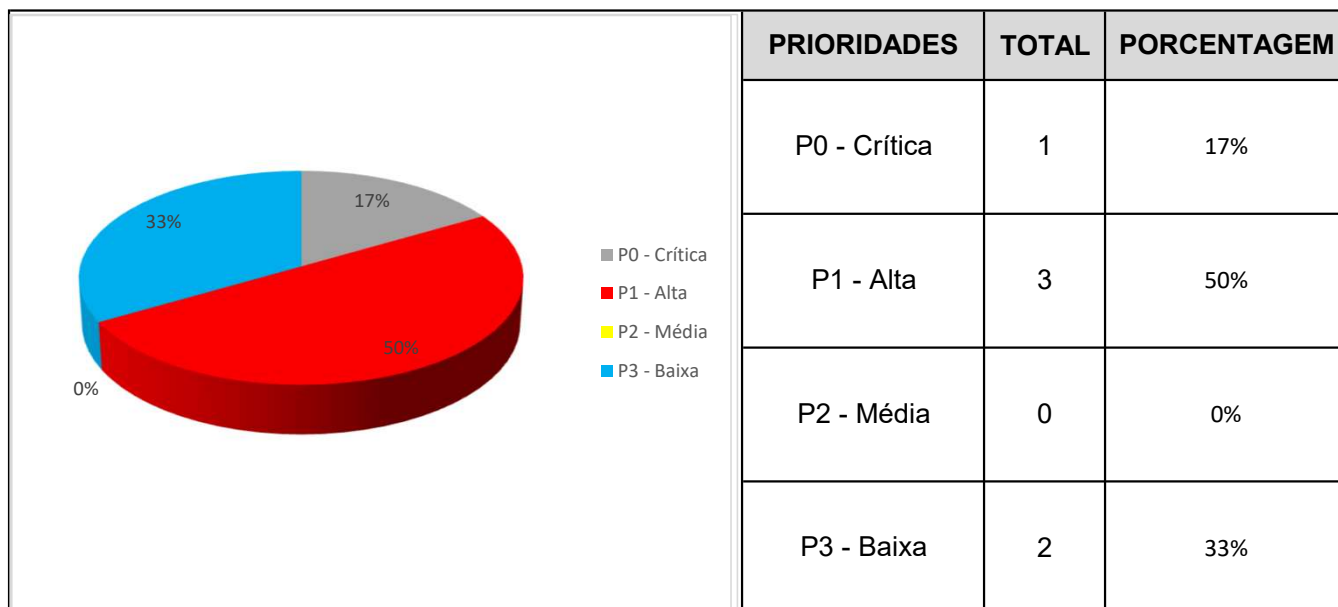


5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE/INFRAÇÃO		
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE	
P0	→	I-4
P1	→	I-3
P2	→	I-2
P3	→	I-1

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 8
		Obra 2507	Revisão 0

6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO

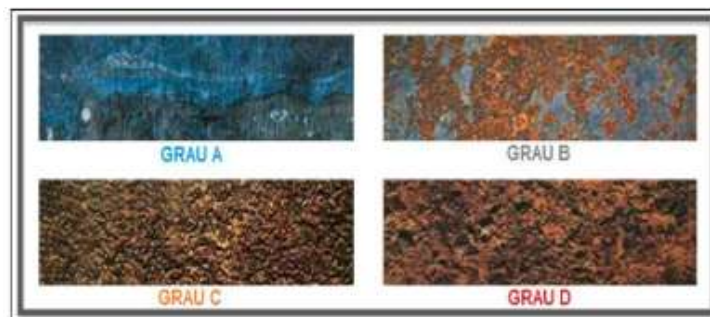

- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

7.1 TIPO DE INSPEÇÃO

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| () Inicial | (X) Periódica | () Extraordinária |
| (X) Externa | () Interna | () TH/Estanqueidade |

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 9
		Obra 2507	Revisão 0

7.2 TIPO DE INSPEÇÃO

☒ Medição de Espessura ☐ Líquido penetrante ☐ Partícula Magnética
☐ Ultrassom ☐ Boroscopia ☒ Visual

8.0 CONCLUSÕES GERAIS

Este compressor de ar está sendo **APROVADO** nesta data, porém necessário atender as solicitações no item de Recomendações deste relatório.

9.0 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Próxima Externa: **21/01/2026**

Próxima Interna: **13/12/2027**

CONTROLE DE EMISSÃO			
Profissional Legalmente Habilitado NR-13	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	17/02/2025 Data

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 10
		Obra 2507	Revisão 0

10.0 - ANEXOS

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 11
		Obra 2507	Revisão 0

10.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13				
Cliente: RUMO Identificação / Tag: CP-TERM-04 Serviço: NR-13		Data: 17/02/2025 Nº do Relatório: 13-0191 Norma de Ref.: NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa		
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	IDENTIFICAÇÃO DE TAG	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o equipamento está com etiqueta em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
2	ESTADO DO COMPRESSOR DE AR	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o compressor de ar está em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
3	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a plaqueta de identificação está fixada no compressor de ar.	Nada consta.	-	
4	ACESSIBILIDADE AOS COMPONENTES	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que os componentes estão visíveis e facilmente acessíveis.	Nada consta.	-	
5	TAMPO ESQUERDO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o tampo esquerdo está com sujidades.	Necessário providenciar a limpeza do equipamento.	P-3	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13				
Cliente: RUMO		Data: 17/02/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:		
Identificação / Tag: CP-TERM-04		Nº do Relatório: 13-0191		P0 = Crítico		
Serviço: NR-13		Norma de Ref.: NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P1 = Prioridade Alta		
				P2 = Prioridade Média		
				P3 = Prioridade Baixa		
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
6	TAMPO DIREITO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o tampo direito está com sujidades.	Necessário providenciar a limpeza do equipamento.	P-3	
7	BASE DE SUSTENTAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a base de sustentação está em condições seguras.	Nada consta.	-	
8	VÁLVULA DE SEGURANÇA	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a válvula de segurança está em condições seguras.	Nada consta.	-	
9	ATERRAMENTO ESTÁTICO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o compressor de ar possui aterramento estático.	Nada consta.	-	
10	MANÔMETRO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o manômetro está em condições seguras.	Nada consta.	-	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13				
Cliente: RUMO Identificação / Tag: CP-TERM-04 Serviço: NR-13		Data: 17/02/2025 Nº do Relatório: 13-0191 Norma de Ref.: NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa		
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
11	PRESSOSTATO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o pressostato está em condições seguras.	Nada consta.	-	
12	TUBULAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a tubulação está em condições seguras.	Nada consta.	-	
13	DRENO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o dreno está em condições seguras.	Nada consta.	-	
14	SAÍDAS DO AMBIENTE	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o ambiente de instalação do compressor de ar possui apenas uma saída.	Necessário adequar ambiente de instalação para duas saídas.	P-1	
15	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que não possui sistema de iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de um sistema de iluminação de emergência.	P-1	

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13				
Cliente: RUMO		Data: 17/02/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:		
Identificação / Tag: CP-TERM-04		Nº do Relatório: 13-0191		P0 = Crítico		
Serviço: NR-13		Norma de Ref.: NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P1 = Prioridade Alta		
				P2 = Prioridade Média		
				P3 = Prioridade Baixa		
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
16	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o sistema de iluminação está conforme a norma.	Nada consta.	-	
17	VENTILAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o local da instalação não possui ventilação adequada.	Necessário providenciar a instalação de um sistema de ventilação para o ambiente.	P-1	
18	MEDIÇÃO DE ESPESSURA	ENSAIO NÃO-DESTRUTIVO	O ensaio de medição de espessura foi realizado pela CONERGE INSPEÇÃO & ENGENHARIA.	Nada consta.	-	
19	MODELO DO MEDIDOR DE ESPESSURA	ENSAIO NÃO-DESTRUTIVO	O modelo do medidor de espessura utilizado é ME-003.	Nada consta.	-	
20	PRONTUÁRIO	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o equipamento possui prontuário conforme descrito no subitem 13.5.1.5 alínea a).	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO


 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13				
Cliente: RUMO		Data: 17/02/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:		
Identificação / Tag: CP-TERM-04		Nº do Relatório: 13-0191		P0 = Crítico		
Serviço: NR-13		Norma de Ref.: NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P1 = Prioridade Alta		
				P2 = Prioridade Média		
				P3 = Prioridade Baixa		
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	TESTE HIDROSTÁTICO	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o compressor de ar não possui documentação de realização do Teste Hidrostático (TH) no seu processo de fabricação assinado por Profissional Legalmente Habilitado (PLH) pelo fabricante ou importador.	Necessário providenciar a documentação da realização do Teste Hidrostático (TH) assinado por Profissional Legalmente Habilitado (PLH) para próxima inspeção anual.	P-0	DOCUMENTAÇÃO
22	REGISTRO DE SEGURANÇA	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o equipamento possui livro de registro de segurança conforme descrito no subitem 13.5.1.5 alínea b).	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
23	MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PMTA	DOCUMENTAÇÃO	Durante a inspeção foi evidenciado que o equipamento possui memória de cálculo da PMTA.	Nada consta.	-	DOCUMENTAÇÃO
24	RELATÓRIO	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o equipamento não possui relatório técnico anterior no prontuário do equipamento, documento essencial para a comprovação da conformidade e integridade do compressor de ar, conforme exigido pelas normativas aplicáveis.	Após a inspeção realizada pela CoNeRge, este será o relatório técnico anterior vinculado a este equipamento.	-	DOCUMENTAÇÃO

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 12
		Obra 2507	Revisão 0

10.2 CROQUI DO EQUIPAMENTO

CLIENTE:	RUMO	OBRA:	2507
TAG:	CP-TERM-04	DESCRIÇÃO:	COMPRESSOR DE AR
EXECUTANTE:	Fernando Wisniewski Junior	DATA EXECUÇÃO:	21/01/2025

CROQUI

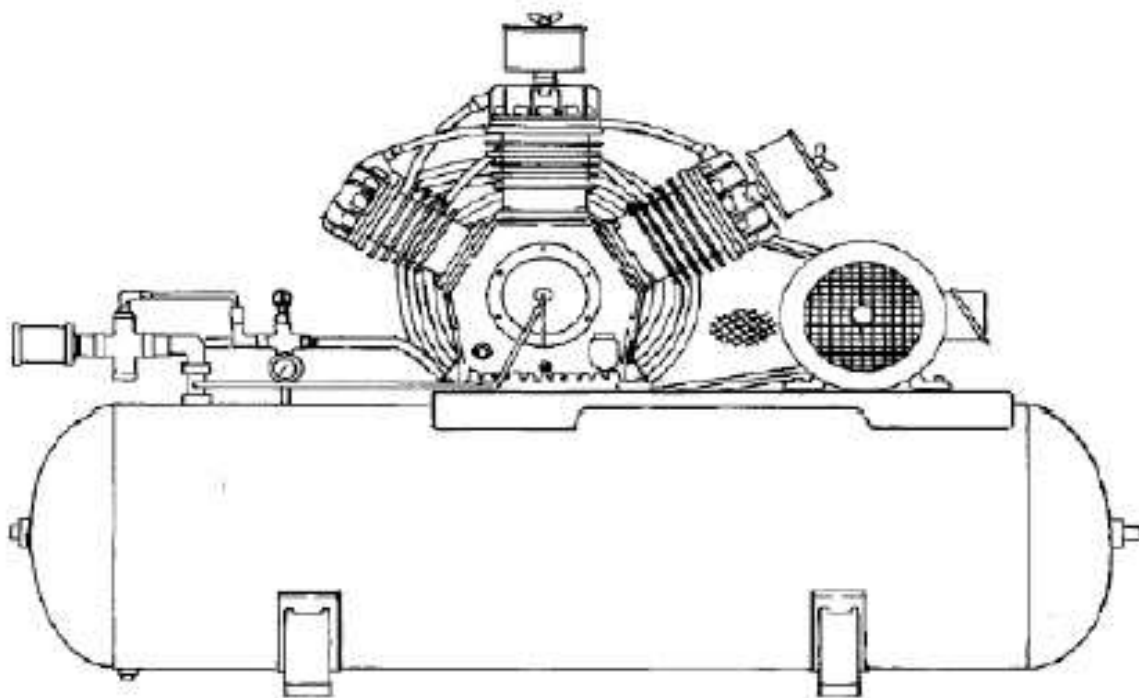

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 13
		Obra 2507	Revisão 0

10.3 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

 A Engenharia das NRs	RELATÓRIO MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRASSOM	
---	---	---



CLIENTE:	RUMO	LOCALIZAÇÃO:	SÃO SIMÃO/GO
TAG:	CP-TERM-04	OBRA:	2507
DESCRIÇÃO:	COMPRESSOR DE AR	DATA EXECUÇÃO:	21/01/2025

<i>Norma de referência / Critério de aceitação:</i>	<i>Nº do procedimento</i>	<i>/ Revisão</i>	<i>Material:</i>	
ASME V ART. 23	PTP-013	02	AÇO CARBONO	
<i>Equipamento:</i>	<i>Bloco de calibração:</i>		<i>Acoplante:</i>	
ME-003	BL-006 AÇO CARBONO 6 DEGRAUS		METIL CELULOSE	
<i>Transdutor:</i>	<i>Temperatura (° C):</i>		<i>Iluminação / lux</i>	
DA 501 EN / 5 MHz / Ø 10mm	25		AMBIENTE	-
<i>Método utilizado:</i>	<i>Condição superficial:</i>			
PULSO-ECO	SOB CAMADA DE TINTA			

RESULTADO
Foi realizado medição de espessura conforme consta na tabela abaixo.


PONTO MEDIDO	POSIÇÃO					ESPESSURA DE CALIBRAÇÃO (mm)	ESPESSURA ATUAL (mm)	ESPESSURA NOMINAL (mm)	ESPESSURA MÍNIMA (mm)	REDUÇÃO (mm)
	0°	90°	180°	270°	CENTRO					
TAMPO DIREITO	5,06	5,08	5,05	5,07	-	6,00	5,05	5,00	3,78	-
COSTADO 01	4,98	4,47	4,46	4,46	-	6,00	4,46	5,00	4,63	0,54
COSTADO 02	4,40	4,47	5,02	4,48	-	6,00	4,40	5,00	4,63	0,60
COSTADO 03	4,99	5,00	4,95	4,99	-	6,00	4,95	5,00	4,63	0,05
TAMPO ESQUERDO	5,04	4,96	5,05	5,01	-	6,00	4,96	5,00	3,78	0,04

OBS: CROQUI EM ANEXO

Data do Relatório:	Nº Relatório	Técnico Responsável: Alessandro Cajaiba	Engº Responsável: Carlos Henrique de Moraes
17/02/2025	13-0191	 Alessandro Siqueira Cajaiba US-ME ASN/ENG Nº UT-3101-ME	 Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984

CLIENTE:	RUMO	OBRA:	2507
TAG:	CP-TERM-04	DESCRIÇÃO:	COMPRESSOR DE AR
EXECUTANTE:	Fernando Wisniewski Junior	DATA EXECUÇÃO:	21/01/2025

CROQUI DO ENSAIO

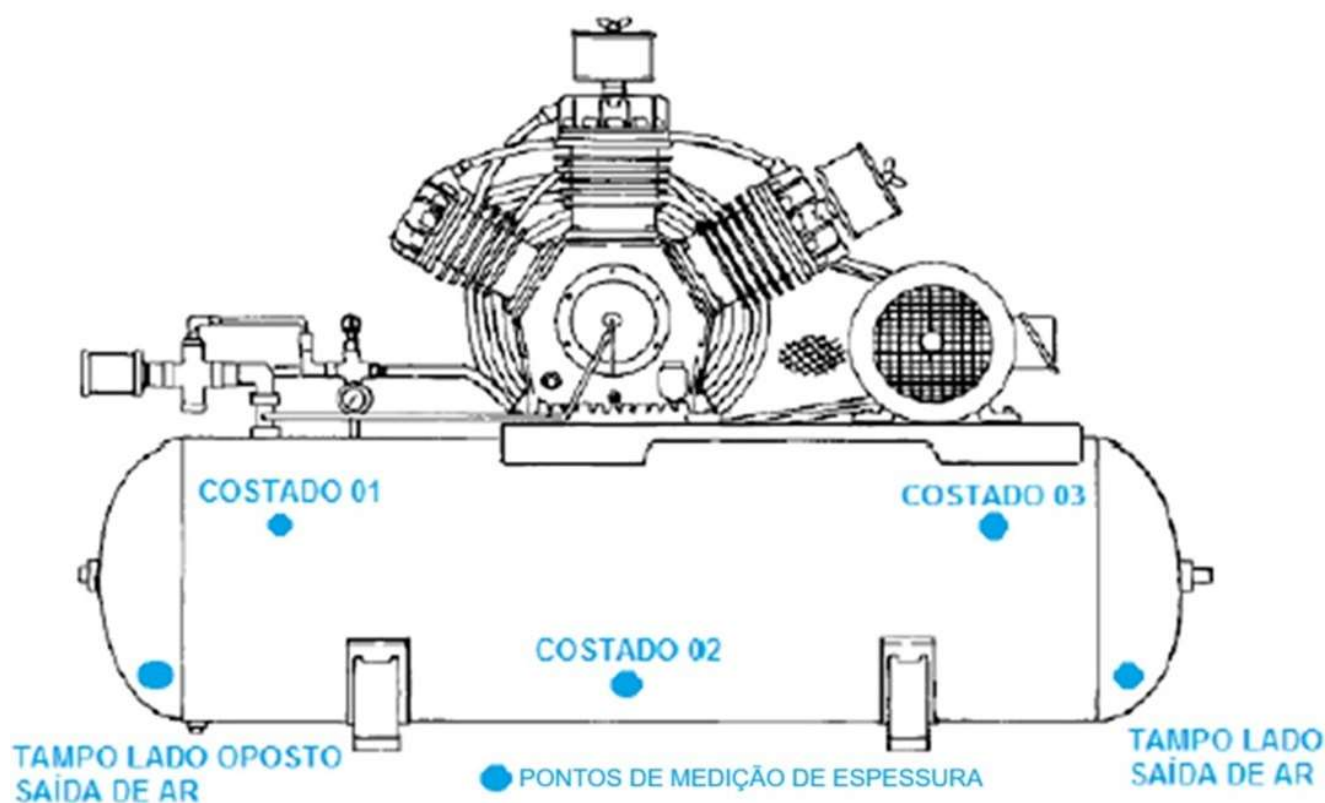

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 14
		Obra 2507	Revisão 0

10.4 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE ESPESSURA

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO nº: 30.735/23

Página: 1 de 1

SOLICITANTE : CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Ordem de Serviço : 7347

Temperatura (°C) : 25

Data de Calibração: 20/07/2023

Validade : 24 Meses.

Umidade (%) : +/-60

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Material : Medidor de Espessura (Ultra-Sonico)

Fabricante: GE

Modelo : DM5E

Nº de Série : CNG-757

Identificação: ME-003

PADROES UTILIZADOS

Jogo de Blocos Padrão Mitutoyo, nº ID: TEC-JB1 , nº Certificado: D5807/21A - Valido Até 06/2024

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO P.OP-05 REVISÃO 02

RASTREABILIDADE DOS INSTRUMENTOS

Os instrumentos utilizados nesta calibração encontram-se rastreados ou calibrados por equipamentos rastreados junto a padrões primários da REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) - INMETRO.

RESULTADO DA CALIBRAÇÃO

mm											
Vvc	Vo1	Vo2	Vo3	Vm	Ip	Ep	Im	Ee	It	K	Veff
1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	2,00	∞
10,00	10,1	10,1	10,1	10,1	0,02	0,00	0,02	0,10	0,12	2,00	∞
21,00	21,1	21,1	21,1	21,1	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	2,00	∞

Terminologia Utilizada :

Vo. Valor obtido (Corresponde ao valor encontrado na unidade submetida à calibração).

Vvc. Valor verdadeiro convencional (Corresponde ao valor do padrão de referência).

Vm. Valor médio (Corresponde a média aritmética dos valores obtidos nas replicações realizadas).

Ip. Incerteza do padrão (Corresponde ao erro estimado do valor verdadeiro convencional, normalmente correspondendo a incerteza total do valor fornecido pelo padrão).

Ep. Erro de precisão (Corresponde ao erro de dispersão dos valores obtidos em relação ao valor médio, calculado para um limite de confiança de 95%, também conhecido como K=2).

Im. A Incerteza de medição relatada e declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Ee. Erro de exatidão (Corresponde ao desvio entre o valor médio eo valor esperado, também conhecido como erro sistemático).

It. Incerteza total (Corresponde ao máximo erro estimado, equivalente a soma do módulo do erro de exatidão com a incerteza de medição).

OBS: Este certificado só se aplica ao material calibrado, não se estendendo a quaisquer lotes mesmo que similares e não deve ser reproduzido, total ou parcialmente, sem prévia autorização.

Calibrado por:

Pedro Henrique Martins
Auxiliar Técnico

Aprovado por:

Elias Demucio
Gerente Técnico

1. **DADOS:** Solicitante: TECNOCERT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
R CONEGO VICENTE, 584 A - SÃO PAULO - SP 11-3441-9786
Interessado: O mesmo
OS: 2106042
Data de calibração: 14/6/2021
Data de próxima: 06/2024

2. **MATERIAL:** Especificação: JOGO DE BLOCOS PADRÃO
Marca: NÃO IDENTIFICADA
Identificação: TEC-JB1
Material: AÇO
Seção: RETANGULAR

3. **PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:**
Os blocos padrão foram medidos em máquina de medir linear, utilizando-se pontas de medição esféricas, por medição diferencial, determinando-se o erro do meio, conforme procedimento interno PC-013-D

4. EQUIPAMENTOS / PADRÕES UTILIZADOS E RASTREABILIDADE:

Máquina de medição linear

Identificação: LMD-139
Última calibração: 10/2/2020
Nº do certificado: D2331/20 Feinmess CAL 0133
Próxima calibração: 02/2022

Blocos padrão-referência

LMD-203
11/7/2018
237/18 Suiçab CAL 0158
07/2021

5. RESULTADOS:

nºsérie individual	valor nominal mm	comprimento no centro mm	erro no centro µm
7115	1	1,0001	0,1
1030	1,1	1,1001	0,1
2024	1,2	1,1999	-0,1
8119	1,3	1,3001	0,1
6147	1,4	1,3999	-0,1
1229	1,5	1,5000	0,0
2316	2	2,0001	0,1
1258	2,5	2,5000	0,0
1359	3	2,9999	-0,1
1129	4	3,9999	-0,1

nºsérie individual	valor nominal mm	comprimento no centro mm	erro no centro µm
1759	4,5	4,5001	0,1
8113	5	5,0000	0,0
8131	6,5	6,5000	0,0
6033	9	9,0001	0,1
2225	10	10,0000	0,0
0109	11,5	11,5001	0,1
0222	13	13,0001	0,1
0106	15	15,0000	0,0
0273	20	19,9999	-0,1
0091	21	21,0001	0,1

6. INCERTEZA DOS RESULTADOS U = $0,3 + L/720 \mu m$, sendo L em mm

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

7. OBSERVAÇÕES:

Temperatura: $20^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$

Coefficiente de expansão térmica adotado: $11,5 \times 10^{-6} K^{-1}$

Erro no centro = diferença entre o comprimento no centro e o comprimento nominal

Calibração realizada nas instalações do laboratório

Este certificado cancela e substitui o mesmo enviado anteriormente por inclusão de periodicidade no campo 1 a pedido do solicitante

assinado digitalmente por:
Eng. Renato da Costa Zernik

Sionatário Autorizado

FVA

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre que avaliou a competência do laboratório.
Este certificado é válido exclusivamente para o objeto verificado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

A REPRODUÇÃO DESTES CERTIFICADO SÓ PODERÁ SER TOTAL

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 15
		Obra 2507	Revisão 0

10.5 CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO

Certificado de Calibração: 5737/25

Santos, 17/02/2025

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: RUMO LOGISTICA
ENDEREÇO: SÃO SIMÃO - GO

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:	MAN-01 (CP-TERM-04)	DIÂMETRO DO INSTRUMENTO:	1/4"
Nº DE REGISTRO:	PI-01-CP04	FABRICANTE:	FÊNIX DO BRASIL
MODELO / CÓDIGO:	NADA CONSTA	LOCAL DE DE INSTALAÇÃO:	CP-TERM-04
LOCAL DE CALIBRAÇÃO:	RUMO - SÃO SIMÃO / GO	SÉRIE:	NADA CONSTA
DIÂMETRO DA CONEXÃO:	3/4"	LACRE:	0000184

3 - CALIBRAÇÃO E AJUSTE:

CAPACIDADE: 20 Bar
CALIBRAÇÃO: 0,00 ~ 20 Bar
FAIXA DE USO: 0,00 ~ 20 Bar

4 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Faixa Calibrada: 0,00 ~ 20 Bar							
Valor de uma divisão: 0,50 Bar							
V.C Avanço	V.M	Erro	Incerteza ±	V.C Retorno	V.M	Erro	Incerteza ±
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,80	1,20	0,45
5,00	4,10	0,90	0,34	15,00	13,80	1,20	0,45
10,00	9,00	1,00	0,38	10,00	8,80	1,20	0,45
15,00	14,00	1,00	0,38	5,00	3,80	1,20	0,45
20,00	19,00	1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Este certificado só poderá ser usado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela CONERGE INSPEÇÃO & ENGENHARIA.
- 2 - A calibração foi realizada utilizando padrões de propriedade da CONERGE INSPEÇÃO & ENGENHARIA.
- 3 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, o qual para uma distribuição t com Veff igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 4 - A calibração foi realizada pelo método de comparação direta, conforme procedimento interno de calibração.
- 5 - N/E = Não Evidenciado.

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 21 °C

6 - PADRÕES UTILIZADOS:

Manômetro Padrão	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2025	RBC

7 - DEFEITOS E SITUAÇÕES CONSTATADAS:

CONDIÇÕES:	000-Condições Normais	LAUDO FINAL:	APROVADO
DATA CALIBRAÇÃO:	23/01/2025	PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:	23/01/2026

8 - COMENTÁRIOS:

Nada consta.

9.1 - TAG DO INSTRUMENTO



9.2 - DURANTE A CALIBRAÇÃO



9.3 - FOTO DO INSTRUMENTO



10 - CONTROLE DE EMISSÃO:

ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 16
		Obra 2507	Revisão 0

10.6 CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA

Certificado de Calibração: 5738/25

Santos, 17/02/2025

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: RUMO LOGISTICA
ENDEREÇO: SÃO SIMÃO - GO

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO:	VÁLVULA DE SEGURANÇA	IDENTIFICAÇÃO - TAG:	PSV-01 (CP-TERM-04)
MODELO:	NADA CONSTA	FABRICANTE:	LUBE-FER
NÚMERO DO LACRE:	0000185	NÚMERO DE SÉRIE:	NADA CONSTA
BALANCEADA:	NÃO	CONEXÃO:	1/4"
PRESSÃO DE ABERTURA:	11,0 Bar	FLUÍDO TESTE:	ÁGUA
SELO UV:	NÃO	VAZÃO:	85,5 m³/h

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (Kg/cm²)	Leitura 1 (Kg/cm²)	Leitura 2 (Kg/cm²)	Leitura 3 (Kg/cm²)	Média	Tendência	Incerteza	Tendência + U95
-	-	-	-	-	-	(U95)	-
11,00	11,00	11,01	11,00	11,0033333	0,003333333	0,01509	0,01842

Pior tendência = 0.00333 kgf/cm²
Pior incerteza (U95) = 0.01509 Kgf/cm²; Veff = 2; K = 4.52656
Pior |tendência+U95| = 1,0000 Kgf/cm²

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Manômetro Padrão	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2025	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 0

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 21 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95,45 % de certeza.
Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais.

Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui obtidas.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CONDIÇÕES:	000-Condições Normais	LAUDO FINAL:	APROVADO
DATA CALIBRAÇÃO:	23/01/2025	PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:	23/01/2026

8 - COMENTÁRIOS:

NADA CONSTA.

9 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



10 - CONTROLE DE EMISSÃO:


ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 17
		Obra 0	Revisão 0

10.7 CALIBRAÇÃO DO PRESSOSTATO

Certificado de Calibração: 5739/25

Santos, 17/02/2025

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: RUMO LOGISTICA
ENDEREÇO: SÃO SIMÃO - GO

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:	PRESS-01 (CP-TERM-04)	FABRICANTE:	LEF00
Nº DE REGISTRO:	NADA CONSTA	SÉRIE:	NADA CONSTA
LOCAL DE CALIBRAÇÃO:	RUMO - SÃO SIMÃO / GO	LACRE:	0000186
LOCAL DE DE INSTALAÇÃO:	CP-TERM-04		

3 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Set Inicial (kgf/cm²)	Set Final (kgf/cm²)	Set encontrado Inicial (kgf/cm²)	Set encontrado Final (kgf/cm²)	Desvio (kgf/cm²)
9,18	6,12	9,18	6,12	0,00

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Este certificado só poderá ser usado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela CONERGE INSPEÇÃO & ENGENHARIA.
- 2 - A calibração foi realizada utilizando padrões de propriedade da CONERGE INSPEÇÃO & ENGENHARIA.
- 3 - A calibração foi realizada pelo método de comparação direta, conforme procedimento interno de calibração.
- 4 - N/E = Não Evidenciado.

4 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 21 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Manômetro Padrão	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2025	RBC

6 - DEFEITOS E SITUAÇÕES CONSTATADAS:

CONDIÇÕES:	000-Condições Normais	LAUDO FINAL:	APROVADO
DATA CALIBRAÇÃO:	23/01/2025	PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:	23/01/2026

7 - COMENTÁRIOS:

NADA CONSTA.

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:



ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0191	Página 18
		Obra 2507	Revisão 0

10.8 A.R.T.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250042709

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)	
CARLOS HENRIQUE DE MORAES	RNP: 2603421441
Título profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica,	Registro: 97798/D-SP
2. Dados do Contrato	
Contratante: Terminal São Simão S.A Terminal São Simão S.A.	CPF/CNPJ: 37.227.676/0001-22
Avenida Av. Eliezer Oliveira Guimarães , Nº SN	Bairro: Distrito Agroindustrial
CEP: 75890-000	Cidade: São Simão-GO
Quadra: NA Lote: NA Complemento:	Fone: (64)99677-2085
E-Mail:	
Contrato: PR. 6.018/24 REV1 / OBRA 2507	Valor Obra/Serviço R\$: 2.200,00
Celebrado em: 26/11/2024	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
3. Dados da Obra/Serviço	
Avenida Av. Eliezer Oliveira Guimarães , Nº SN	Bairro: Distrito Agroindustrial
CEP: 75890-000	Cidade: São Simão-GO
Quadra: NA Lote: NA Complemento:	Coordenadas Geográficas: -18.975058,-50.5549719
Data de Início: 21/01/2025	Previsão término: 30/04/2025
Finalidade: Industrial	
Proprietário(a): Terminal São Simão S.A Terminal São Simão S.A.	CPF/CNPJ: 37.227.676/0001-22
E-Mail:	Fone: (64) 996772085
	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado
4. Atividade Técnica	
SUPERVISAO OU COORDENACAO	Quantidade Unidade
INSPEÇÃO VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO	8,00 UNIDADES
ENSAIO EQUIPAMENTOS MECANICOS OU ELETROMECHANICOS	26,00 UNIDADES
<i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i>	
<i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>	
5. Observações	
RUMO - São Simão/GO - NR-13 - INSPEÇÃO EM VASOS DE PRESSÃO E CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS: VP-TERM-01, VP-TERM-02, VP-TERM-03, VP-TERM-04, CP-TERM-01, CP-TERM-02, CP-TERM-03, CP-TERM-04, MAN-01_VP-TERM-01, MAN-01_VP-TERM-02, MAN-01_VP-TERM-03, MAN-01_VP-TERM-04, MAN-01_CP-TERM-03, MAN-01_CP-TERM-04, MAN-01_TB-01-A, MAN-02_TB-01-A, MAN-01_TB-02-B, MAN-02_TB-02-B, MAN-01_TB-03-C, MAN-02_TB-03-C, MAN-01_TB-04-D, MAN-02_TB-04-D, MAN-01_CALADOR-01, MAN-01_CALADOR-02, PSV-01_VP-TERM-01, PSV-01_VP-TERM-02, PSV-01_VP-TERM-03, PSV-01_VP-TERM-04, PSV-01_CP-TERM-02, PSV-01_CP-TERM-03, PSV-01_CP-TERM-04, PSV-01_CP-TERM-01, PRESS-01_CP-TERM-03, PRESS-01_CP-TERM-04)	
6. Declarações	
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.	
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br .
Declaro serem verdadeiras as informações acima	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
SANTOS, 07 de MARÇO de 2025	- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
Local Data	
CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
	Tel: (62) 3221-6200
Terminal São Simão S.A Terminal São Simão S.A. - CPF/CNPJ: 37.227.676/0001-22	

Valor da ART: 103,03	Registrada em 07/03/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125063314	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------
